



Universidade Federal de Pernambuco  
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

## **RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (março 2024)**

### **Reforma das Salas de Dança do Departamento de Artes do Centro de Artes e Comunicação (CAC) do Campus Recife da UFPE**

Data de início: **15/01/2024**

Prazo de execução: **120 dias**

Vigência do contrato: **25/09/2024**

Empresa executora: **MGR Engenharia e Incorporação LTDA**

Número do contrato: **95/2023**

Engenheiro Fiscal: **Leandro Lima**

Valor da obra: **R\$ 783.874,58**

Valor pago: **R\$ 340.035,58**

Percentual executado da obra: **43,38%**

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas três salas de Dança existentes no Departamento de Artes do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, em cada uma das salas de Dança está previsto uma reforma interna completa, com a instalação de um novo piso em madeira para realização das atividades, pintura das paredes e teto, substituição dos espelhos, dentre outros serviços. Na área externa está previsto a substituição do passeio, pintura das fachadas e reforma das cobertas existentes.

Atualmente o serviço em uma das três salas de dança (sala nº 2) foi 100% concluído e na área externa estão sendo executados os serviços de construção dos passeios e início do serviço de pintura das fachadas, como pode ser visto no relatório fotográfico abaixo.

### **Relatório fotográfico (março 2024)**



Início dos serviços na sala nº 2 (demolições)



Instalação de novo piso de madeira na sala nº 2

**Sala de dança 02: 100% concluída**




Sala de Dança n° 02



Sala de Dança 02



Sala de Dança 02

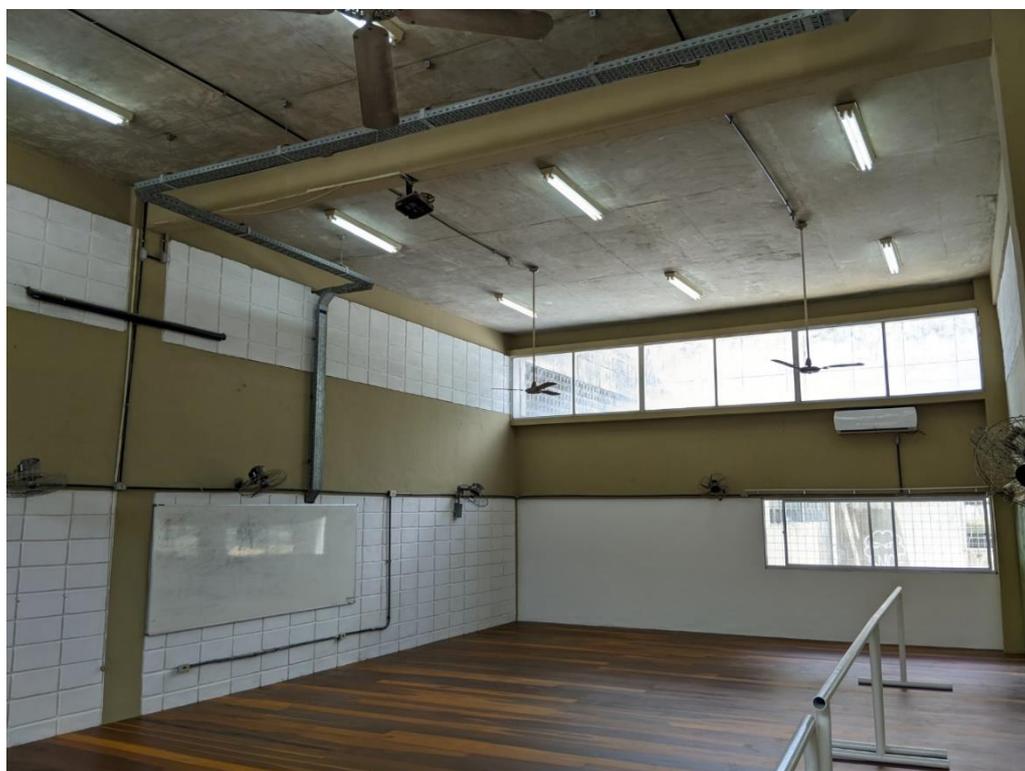

Sala de Dança 02

## Área Externa



Construção de canaletas para Drenagem



Construção do passeio na área externa



Preparação para início dos serviços na fachada (pintura das paredes e grades)
